

OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

ITEM	OBRA	DISTRITO	MODALIDAD	MONTO DEL PROYECTO S/.	COFINANCIAMIENTO DE EPSEL S.A	PLAZO DE EJECUCION	CRONOGRAMA DE EJECUCION		AVANCE (%)		ESTADO ACTUAL	OBSERV.
							FECHA DE INICIO	FECHA TERMINO	ACTUAL	ACUMULADA		
1	REMODELACION Y AMPLIACION DE HALL DE ATENCION AL USUARIO SEDE COMERCIAL EPSEL S.A CHICLAYO-LAMBAYEQUE	CHICLAYO	Administracion Directa	281534.44	281534.44	60 DIAS	03/03/2010	15/06/2010	2.00	100.00	CULMINADA	OBRA RECEPCIONADA
2	MEJORAMIENTO DEL EMISOR NORTE-NORTE Ø 42" FONDO SAN PEDRO-LOS MANGOS-AL COSATADO DE LA CARRETERA ANTIGUA - SAN JOSE	CHICLAYO	Administracion Directa	551,815.40	551,815.40	45 DIAS	05/04/2010	15/09/2010	0.00	100.00	CONCLUIDA	RECEPCIONADA Y PROCESO DE LIQUIDACION
3	INSTALACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PP.JJ. VIRGEN DEL CARMEN Y LAGUNA DE OXIDACION - DE MOCUPE TRADICIONAL	MOCUPE	Administracion Directa	1,576,962.96	1,576,962.96	150 DIAS	04/05/2009	26/02/1900	57.00	57.00	EN EJECUCION	SE ESTA CONCLUYENDO LA LINEA DE DESCARGA




OBRAS POR CONTRATA

ITEM	OBRA	DISTRITO	MODALIDAD	MONTO DEL PROYECTO S/.	PLAZO DE EJECUCION	CRONOGRAMA DE EJECUCION		AVANCE (%)		ESTADO ACTUAL	OBSERV.
						FECHA DE INICIO	FECHA TERMINO	ACTUAL	ACUMULADA		
1	REMODELACION DE LOS AMBIENTES DEL LABORATORIO DE MICROMEDICION Y EQUIPAMIENTO EN EL LOCAL DE LA GERENCIA COMERCIAL	CHICLAYO	CONTRATA	208,438.52	105 DIAS	02/07/2010	14/10/2010	100.00	100.00	CULMINADA	PROCESO DE RECEPCION
2	MEJORAMIENTO DEL EMISOR SUR DE 250MM DE LA CALLE TUPAC AMARU - PICSÍ	PICSÍ	CONTRATA	68,458.94	30 DIAS	27/08/2010	25/09/2010	1.5	100.00	CULMINADA	PROCESO DE RECEPCION
3	MEJORAMIENTO DE LA CAMARA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA Urb. EL AMAUTA	CHICLAYO	CONTRATA RECURSOS PROPIOS	80,812.25	60 DIAS	30/09/2010	28/11/2010	27.67	100.00	CULMINADA	PROCESO DE RECEPCION
4	AMPLIACION DE LA LINEA DE DESCARGA DE LA LAGUNA DE ESTABILIZACION DE ILLIMO	ILLIMO	CONTRATA RECURSOS PROPIOS	144,885.05	45 DIAS	07/10/2010	20/12/2010	100.00	100.00	CULMINADA	PROCESO DE RECEPCION
5	MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL DISTRITO DE PIMENTEL PROVINCIA DE CHICLAYO	PIMENTEL	CONTRATA-PROGRAMA "AGUA PARA TODOS"	3,586,482.00	240 DIAS	03/05/2010	28/01/2011	0.64	91.25	EN EJECUCION	LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAZADA EN 5.99%


OBRAS EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD

ITEM	OBRA	DISTRITO	MODALIDAD	MONTO DEL PROYECTO S/.	PLAZO DE EJECUCION	CRONOGRAMA DE EJECUCION		AVANCE (%)		ESTADO ACTUAL	OBSERV.
						FECHA DE INICIO	FECHA TERMINO	ACTUAL	ACUMULADA		
1	CONSTRUCCION DE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA H.U MAXIMO DIAZ MUÑOS	J.L.O	CONTRATA	1,057,714.60	120 DIAS	20/09/2010	21/12/2010	100.00	100.00	CULMINADA	PROCESO DE RECEPCION DE OBRA
2	HABILITACION URBANA JOCKEY CLUB DE CHICLAYO	CHICLAYO	POR ENCARGO	445,343.70	60 DIAS	09/04/2010	08/07/2010	100.00	100.00	CULMINADA	DEMORA EN PRESENTACION DE DOCUMENTO PARA RECEPCION DE OBRA
3	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CERCADO Y PUEBLOS JOVENES DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO	PUEBLO NUEVO	CONTRATA	32,939,915.69	360 DIAS	20/05/2009	20/05/2010	2.04	96.5	EN EJECUCION	
4	MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION OPERATIVA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AV. PROLONGACION BOLOGNESI - CHICLAYO	CHICLAYO	PROgrama Agua Para todos - Ministerio de Vivienda y Construccion	9,980,000.00	210 DIAS	21/07/2010	21/01/2011	11.50	25.00	EN EJECUCION	SE HA INTENSIFICADO EN EL AVANCE DE LA OBRA
5	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE DE PIMENTEL	PIMENTEL	PROgrama Agua Para todos - Ministerio de Vivienda y Construccion	4,098,582.29	180 DIAS	28/05/2010	21/11/2010	0.22	95.00	EN EJECUCION	LA EJECUCION DE ESTA OBRA ESTA LENTA
6	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	PROgrama Agua Para todos - Ministerio de Vivienda y Construccion	51,892,704.20	540 DIAS	06/06/2010	27/11/2010	4.13	17.73	EN EJECUCION	el contratista ha previsto incrementar frentes de obras con la finalidad de lograr un mayor avance fisico de la obra
7	AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LINEA DE REFORZAMIENTO DE LOS PP.JJ DEL SUR DE LA VICTORIA	LA VICTORIA	PROgrama Agua Para todos - Ministerio de Vivienda y Construccion	7,066,424.16	180 DIAS	26/05/2010	21/11/2010	0.00	30.86	EN EJECUCION	EL CONTRATISTA A PARLIZADO LA OBRA POR FALTA DE PAGO EN LAS VALORIZACIONES 02.03.04 Y 05.

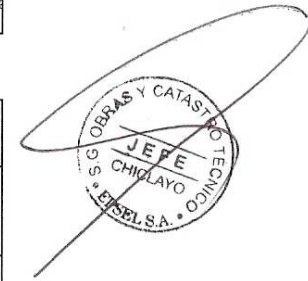

OBRAS EJECUTADAS POR ENCARGO

ITEM	OBRA	DISTRITO	MODALIDAD	MONTO DEL PROYECTO S/.	PLAZO DE EJECUCION	CRONOGRAMA DE EJECUCION		AVANCE (%)		ESTADO ACTUAL	OBSERV.
						FECHA DE INICIO	FECHA PROG. TERMINO	ACTUAL	ACUMULADA		
1	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE NUEVA ARICA	NUEVA ARICA	POR ENCARGO	825,331.00	90 DIAS	02/08/2010	30/10/2010	65.00	65.00	PARALIZADA	
2	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO CAPOTE	PICSI	Programa Agua Para todos - POR ENCARGO	2,053,382.06	120 DIAS	05/04/2010	02/08/2010	0.00	73.95	PARALIZADA	PARALIZADA POR PAGO A LOS TRABAJADORES
3	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE OYOTÚN	OYOTÚN	POR ENCARGO	1,547,485.07	150 DIAS	18/01/2010	16/06/2010	0.14	54.40	PARALIZADA	SE PARALIZA POR EL TEMA DE TRANSFERENCIA DE GOBIERNO LOCAL



OBRAS POR TERCEROS

ITEM	OBRA	DISTRITO	MODALIDAD	CARGO	MONTO DEL PROYECTO S/.	PLAZO DE EJECUCION	CRONOGRAMA DE EJECUCION		AVANCE (%)		ESTADO ACTUAL	OBSERV.
							FECHA DE INICIO	FECHA TERMINO	ACTUAL	ACUMULADA		
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MOCHUMI	MOCHUMI	TERCEROS	COORDINADOR DE OBRAS	9,110,290.26	240 DIAS	02/06/2009	27/01/2010	98.35	98.35	Paralizada	LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR FALTA DE LIQUIDES
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE OYOTÚN	OYOTÚN	TERCEROS	COORDINADOR DE OBRAS	9,581,173.72	240 DIAS	07/07/2010	16/02/2011	13.35	13.35	Paralizada	LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR FALTA DE LIQUIDES
3	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE MONSEFU	MONSEFU	TERCEROS	COORDINADOR DE OBRAS	4,582,495.63	150 DIAS	30/04/2010	30/09/2010	100.00	100.00	TERMINADA	
4	MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO, SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE ZAÑA.	ZAÑA	TERCEROS	COORDINADOR DE OBRAS	46,878,758.65	180 DIAS	27/04/2010	30/10/2010	73.08	73.08	EN EJECUCION	HASTA LA FECHA NO HAY EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR EPSEL S.A
5	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LA ENCALADA	PIMENTEL	TERCEROS	INSPECTOR DE OBRA	1,159,544.32	120 DIAS	15/02/2010	12/06/2010	94.00	94.00	Paralizada	la obra se encuentra Paralizada
6	AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA la H U "Parque Residencial Villa del Norte La Esmeralda.	CHICLAYO	TERCEROS	INSPECTOR DE OBRA	535,976.68	90 DIAS	27/05/2010	25/08/2010	100.00	100.00	CULMINADA	EN PROCESO DE RECEPCION
7	AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL Edificio Multifamiliar Venecia Pallace II - Chiclayo"	CHICLAYO	TERCEROS	INSPECTOR DE OBRA	88,795.96	30 DIAS	25/08/2010	02/10/2010	100.00	100.00	CULMINADA	EN PROCESO DE RECEPCION
8	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORIDA II ETAPA	CHICLAYO	TERCEROS	INSPECTOR DE OBRA	545,054.08	30 DIAS	20/10/2010	18/11/2010	100.01	100.00	CULMINADA	EN PROCESO DE RECEPCION
9	INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA RESIDENCIAL PASEO SALAVERRY	CHICLAYO	TERCEROS	INSPECTOR DE OBRA	88,965.52	30 DIAS	25/10/2010	25/11/2010	100.00	100.00	CULMINADA	EN PROCESO DE RECEPCION
10	REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA CLINICA UNIVERSITARIA DE LA USAT - CHICLAYO	CHICLAYO	TERCEROS	INSPECTOR DE OBRA	46,694.10	30 DIAS	04/09/2010	03/10/2010	100.00	100.00	CULMINADA	EN PROCESO DE RECEPCION



OBRAS LIQUIDADAS

ITEM	DENOMINACION	ESTADO ACTUAL	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL QUE APRUEBAN LA LIQUIDACION
1	INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL A.H MIGUEL GRAU SEMINARIO, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	LIQUIDADADA	R.G.G N° 352 - 2010 EPSEL S.A/G.G
2	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DEL P.J ANTONIO RAYMONDI - LA VICTORIA	LIQUIDADADA	R.G.G N° 351 - 2010 EPSEL S.A/G.G
3	AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN MZ. A,D,P Y Q DE LA URB. POPOLAR TUPAC AMARU - PIMENTEL	LIQUIDADADA	R.G.G N° 377 - 2010 EPSEL S.A/G.G
4	ALCANTARILLADO CALLE IMPERIO Crda. 7,8,9,10 Y 11 - LA VICTORIA	LIQUIDADADA	R.G.G N° 331 - 2010 EPSEL S.A/G.G
5	RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO Av. LAS DUNAS Mz. D4,E4 Y CALLE FERREÑAFE CUADRAS 8,9,10 Y 11 P.J SAN MARTIN - LAMBAYEQUE	LIQUIDADADA	R.G.G N° 406 - 2010 EPSEL S.A/G.G
6	AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS CA. JOSE L. ORTIZ Y ALFONSEO UGARTE - PIMENTEL	LIQUIDADADA	PARA REVISION DE ASESORIA LEGAL
7	RED DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS UPIS MILAGRO DE DIOS III ETAPA J.L.O	LIQUIDADADA	R.G.G N° 330 - 2010 EPSEL S.A/G.G
8	RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. 07 DE JUNIO - PIMENTEL	LIQUIDADADA	R.G.G N° 348 - 2010 EPSEL S.A/G.G
9	RED DE AGUA POTABLE P.J 1RO DE JUNIO AV. LOS INCAS LA VICTORIA	LIQUIDADADA	R.G.G N° 407 - 2010 EPSEL S.A/G.G
10	REDES COLECTORES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MONTES DE LA VIRGEN - LAMBAYEQUE	LIQUIDADADA	R.G.G N° 401 - 2010 EPSEL S.A/G.G
11	AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CALLE BOLIVAR UPIS SAN MIGUEL - J.L.O	LIQUIDADADA	R.G.G N° 403 - 2010 EPSEL S.A/G.G
12	AGUA Y DESAGUE DE LA PRIMAVERA CUADRA JR. PORCULLA TUPAC AMARU - CHICLAYO	LIQUIDADADA	R.G.G N° 400 - 2010 EPSEL S.A/G.G
13	AMPLIACION DE REDES COLECTORAS DE ALCANTARILLADO DE AV. CHICLAYO PROLONGACION BOLIVAR, 25 DE NOVIEMBRE - J.L.O	LIQUIDADADA	R.G.G N° 402 - 2010 EPSEL S.A/G.G
14	AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 2DA ETAPA LA EXPLANADA 4 DE JULIO J.L.O	LIQUIDADADA	R.G.G N° 404- 2010 EPSEL S.A/G.G
15	RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA CALLE GRAU C-10 CIUDAD ETEN	LIQUIDADADA	R.G.G N° 405- 2010 EPSEL S.A/G.G
16	RENOVACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y COLECTORES DE LA CALLE LETICIA Y SUS TRANSVERSALES DESDE LA AV. SAENZ PEÑA A LA AV. BALTA	LIQUIDADADA	R.G.G N° 399- 2010 EPSEL S.A/G.G
17	RENOVACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL P.J SAN FRANCISCO Y BUENOS AIRES	LIQUIDADADA	R.G.G N° 398- 2010 EPSEL S.A/G.G
18	AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE P.J FANNY ABANTO	LIQUIDADADA	R.G.G N° 412- 2010 EPSEL S.A/G.G

