

**Resumen de Avance Físico de Obras por Administración Directa – Programa  
Shock de Inversiones – Junio 2007**

- Obra: **Renovación de la Red de Agua Potable y Colector de la Calle Leticia y sus Transversales desde la Av. Sáenz Peña a la Balta.**
- Modalidad: Administración Directa
- Presupuesto de la Obra: **1.349.116,93 S/. Incl. I.G.V**

Plazo de ejecución: 150 días calendario

Inicio: 22/02/07

Término: 22/07/07

	Avance Físico Anterior (22 Feb al 31 May)	Avance Físico Actual (01 al 30 Junio)	Avance Físico Acumulado (22 Feb – 30 Junio)	% Avance Físico Total	Residente de Obra
Sistema de Agua Potable	27.70 %	9.11 %	<b>36.81 %</b>	-	Ing. José Perla
Sistema de Alcantarillado	38.75 %	16.68 %	<b>55.42 %</b>	-	Céspedes
Información proporcionada por Asistente de Obra.				<b>49.34 %</b>	

- Obra: **Renovación de Redes de Agua Potable, Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias del Pueblo Joven Diego Ferré.**
- Modalidad: Administración Directa
- Presupuesto de la Obra: **1.264.191,03 S/. Incl. I.G.V**

Plazo de ejecución: 120 días calendario

Inicio: 22/02/07

Término: 22/06/07

	Avance Físico Anterior (22 Feb al 31 May)	Avance Físico Actual (01 al 30 Junio)	Avance Físico Acumulado (22 Feb - 30 Junio)	% Avance Físico Total	Residente de Obra
Sistema de Agua Potable	0.00%	0.00%	<b>0.00%</b>	-	Ing. José Perla
Sistema de Alcantarillado	70.22 %	13.06 %	<b>83.28 %</b>	-	Céspedes
				<b>54.18 %</b>	

- Obra: **Renovación de la Redes de Agua Potable, Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias**

**del Pueblo Joven Muro.**

- Modalidad: Administración Directa
- Presupuesto de la Obra: **1.063.991,20 S/. Incl. I.G.V**

Plazo de ejecución: 120 días calendario

Inicio: 15/02/07

Término: 15/06/07

	Avance Físico Anterior (15 Feb al 31 May)	Avance Físico Actual (01 al 30 Junio)	Avance Físico Acumulado (15 Feb - 30 Junio)	% Avance Físico Total	Residente de Obra
Sistema de Agua Potable	43.77 %	36.30 %	<b>80.07 %</b>	-	Ing. Percy Rivadeneira Céspedes
Sistema de Alcantarillado	69.25 %	0.00 %	<b>69.25%</b>	-	
				<b>74.05 %</b>	

- Obra: **Instalación de la Red de Agua Potable y Ampliación con Conexiones Domiciliarias del Sector Villa Perpetuo Socorro - Puerto Eten.**
- Modalidad: Administración Directa
- Presupuesto de la Obra: **1.097.548,18 S/. Incl. I.G.V**

Plazo de ejecución: 150 días calendario

Inicio: 26/02/07

Término: 26/07/07

	Avance Físico Anterior (26 Feb al 31 May)	Avance Físico Actual (01 al 30 Junio)	Avance Físico Acumulado (26 Feb - 30 Junio)	% Avance Físico Total	Residente de Obra
Rehabilitación y Equipamiento de Pozo	0.00%	0.00%	<b>0.00%</b>	-	Ing. José Quiñones Yahiro
Caseta de Bombeo de Agua	0.00%	0.00%	<b>0.00%</b>	-	
Línea de Impulsión de Agua Potable	61.57 %	14.40 %	<b>75.97 %</b>	-	
Reservorio Elevado 400 M <sup>3</sup>	3.14 %	0.00 %	<b>3.14 %</b>	-	
Sistema de Agua Potable	77.17 %	11.71 %	<b>88.87 %</b>	-	
Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado	0.00%	12.32%	<b>12.32%</b>	-	
				<b>29.27%</b>	

- Obra: **Renovación de Redes de Agua Potable, Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias de los PP.JJ. San Francisco y Buenos Aires.**


- Modalidad: Administración Directa
- Presupuesto de la Obra: **1.280.101,66 S/. Incl. I.G.V**

Plazo de ejecución: 150 días calendario

Inicio: 19/02/07

Término: 19/07/07

	Avance Físico Anterior (19 Feb al 31 May)	Avance Físico Actual (01 al 30 Junio)	Avance Físico Acumulado (19 Feb - 30 Junio)	% Avance Físico Total	Residente de Obra
Sistema de Agua Potable	19.98 %	25.45%	<b>45.43 %</b>	-	Ing. Teodoro Casas Pisfil
Sistema de Alcantarillado	62.32 %	15.79%	<b>78.11 %</b>	-	
				<b>69.24 %</b>	

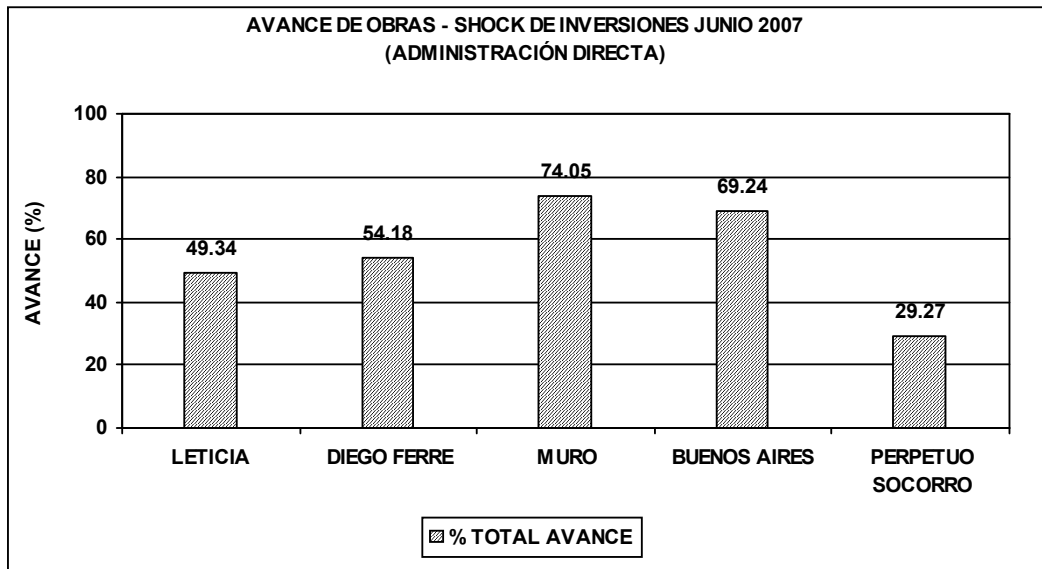

## **PLAN MAESTRO OPTIMIZADO**

**Épsel S.A.** viene formulando su plan maestro optimizado, el cual es un estudio que permitirá la **Programación de las inversiones, estimación de los ingresos y de los costos** requeridos para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, en un horizonte de planeamiento de 30 años.

### **OBJETIVO**

Uno de los objetivos es proponer mejoras de gestión y calidad de servicio para nuestros clientes, como resultado de un diagnóstico de los sistemas operativos, comerciales, financieros e institucionales de los 26 localidades administradas por la empresa, a través de un programa de Inversiones de mejoramiento, renovación y ampliación de los sistemas.
